



## Sanierung Gässli / Wasserleitungersatz Baselweg

### Belagsarbeiten

Die Bauarbeiten im Gässli sind bald abgeschlossen. Ausstehend ist noch der Belageinbau im Gässli sowie die Deckbelagsarbeiten im Baselweg und Gässli.

**Diese Belagsarbeiten finden wie folgt statt:**

- **Belageinbau Gässli** **8. + 9. Juli 2024**
- **Vorarbeiten Deckbelag Baselweg** **10. - 12. Juli 2024**
- **Deckbelag 1. Etappe** **15. Juli 2024**
- **Deckbelag 2. Etappe** **16. Juli 2024**

**Reservedatum für eine witterungsbedingte Verschiebung des Deckbelageinbaus ist 17. + 18. Juli 2024.**

Die Etappierung ist auf der Rückseite ersichtlich.

Am Tag des Belageinbaus ist der jeweilige Abschnitt ab 07.00 Uhr für 24 Stunden nicht befahrbar.

Während den Belagsarbeiten in der 1. Etappe ist die Ein-/Ausfahrt in die Hauptstrasse gesperrt.

Witterungsbedingte Terminkorrekturen oder Änderungen des vorgesehenen Bauablaufs sind möglich. Bauunternehmung und Bauleitung werden bemüht sein, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Im Namen der Gemeinde Hochwald bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

### Zuständig für die Baustelle:

#### Projekt- und Bauleitung

Sutter Ing.- und Planungsbüro AG, Reinach  
Bauleiter, Rolf Schlumpf 061 715 95 47  
[rolf.schlumpf@sutter-ag.ch](mailto:rolf.schlumpf@sutter-ag.ch)

#### Baumeister

Albin Borer AG, Laufen 061 789 90 10  
Bauführer, Gauthier Schirmer


#### Gemeinde Hochwald

Gemeindeverwaltung 061 751 40 10



# Sanierung Gässli / Wasserleitungersatz Baselweg

## Deckbelag 1. Etappe (Hauptstrasse - Gässli)

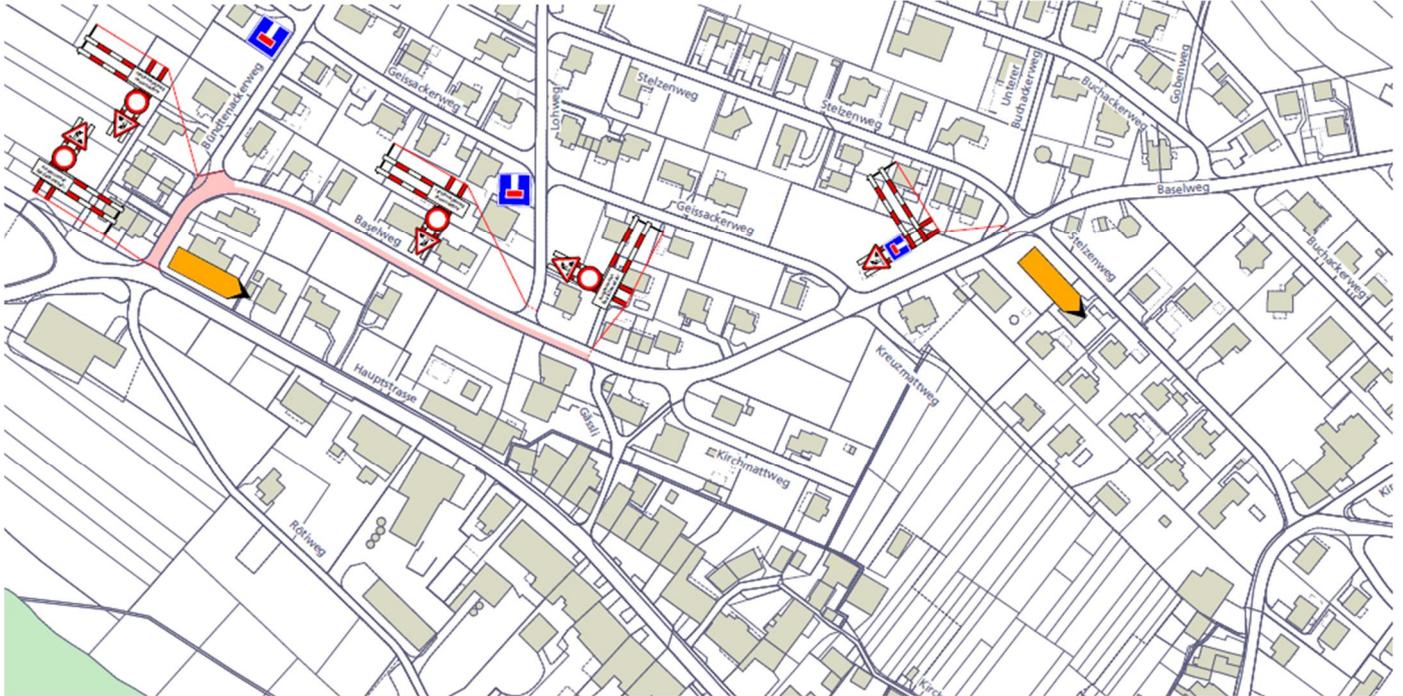

## Deckbelag 2. Etappe (Gässli - Stelzenweg)

